

Rapportage wettelijke eindcontrole na asbestsanering conform NEN2990.
Projectnummer ANSAYA: 23010258-2

Versienummer:

1

Utrecht, 31 januari 2023

Opdrachtgever

Opdrachtgever
De Vries Asbestsanering
t.a.v. afdeling Asbestsanering
Wellpoort 37AA
2415 BWNieuwerburg

Projectgegevens asbestsanering

Project.nr. asbestsaneerder: 20230137
Kenmerk inventarisatierapport: REBA SCAN P-22108-0011 V!
Meldingsnummer: 1486353

DTA op locatie:

Onderzoeksgegevens

Type onderzoek: Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.
Visuele inspectie, onder accreditatie.
Asbestconcentratiemetingen, zie bijlagen.
Plaats van onderzoek: Molenlaan 3 te Bergambacht

Aard van de asbestsanering: 2
Riskoklasse SZW: Ja
Containment: 31-jan-23
Datum controle: 0:25
Tijdsduur visuele inspectie (uu:min):
Inspecteur:

Omschrijving werkzaamheden en/of werkplek

Omschrijving werkzaamheden en/of werkplek: betreft het verwijderen van lijm op tegels wanden toilet

Inhoud containment (m³):	12	Omschrijving maakveld	binnensituatie
Afmeting containment (m²):	4	Weersomstandigheden	nvt
Aantal segmenten:	1		

Gesaneerde bronnummer(s) cf. inv. rapport en mededelingen DTA en/of werkplan:

Bron nr. cf. inv. rapport	Locatie bouwdeel	Hoeveelheid verwijderd materiaal	Materiaal	Soort Asbest	Gehalte	Gebondenheid
5	toilet	14m2	lijm	chrysotiel	0,1-2%	hechtgebonden

Conclusie visuele inspectie conform NEN2990:

In orde bevonden

Zie bijlage 1 bij deze rapportage voor gedetailleerde informatie over de uitgevoerde visuele inspectie met bijbehorende opmerkingen, uitsluitingen en beperkingen.

Conclusie concentratiemeting conform NEN2990:

De berekende gemiddelde concentraties in de gemeten ruimten zijn, getoetst aan de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval, NIET nomoverschrijdend (grenswaarde ministerie van SZW).

Zie bijlage 2 voor de resultaten van de uitgevoerde concentratie luchtmetingen

Conformiteitsverklaring

Het aangeboden werkgebied voldoet aan de eisen uit de NEN2990 en mag conform artikel 4.51a van het Arbeidsomstandighedenbesluit WEL zonder gebruik van persoonlijke asbestgerelateerde beschermingsmiddelen betreden worden.

Opmerkingen

Dit hoofd rapport en de bijlagen dienen hetzelfde project- en versie nummer van ANSAYA te bevatten.

Op alle offertes, opdrachten en rapporten van ANSAYA zijn de voorwaarden van de DNR2011 van toepassing alsmede de eigen voorwaarden.

Dit hoofd rapport bestaat uit dit voorblad met daarbij een tekenblad, fotopagina(s) en bijlagen.

Aantal bijlagen toegevoegd:

2

Toegevoegde bijlage(n):

Bijlage 1: Bevindingenrapport Visuele Inspectie Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering
Bijlage 2: Luchtmetingen Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering conform NEN2990.



Handtekening inspecteur ANSAYA:

Ivan3


Handtekening DTA:

Tekeningblad behorende bij rapportage wettelijke eindcontrole na asbestsanering conform NEN2990.

Projectnummer ANSAYA: 23010258-2

Versienummer: 1

Plaats van onderzoek	Molenlaan 3 te Bergambacht
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.
Omschrijving werkplek	betreft het verwijderen van lijm op tegels wanden toilet

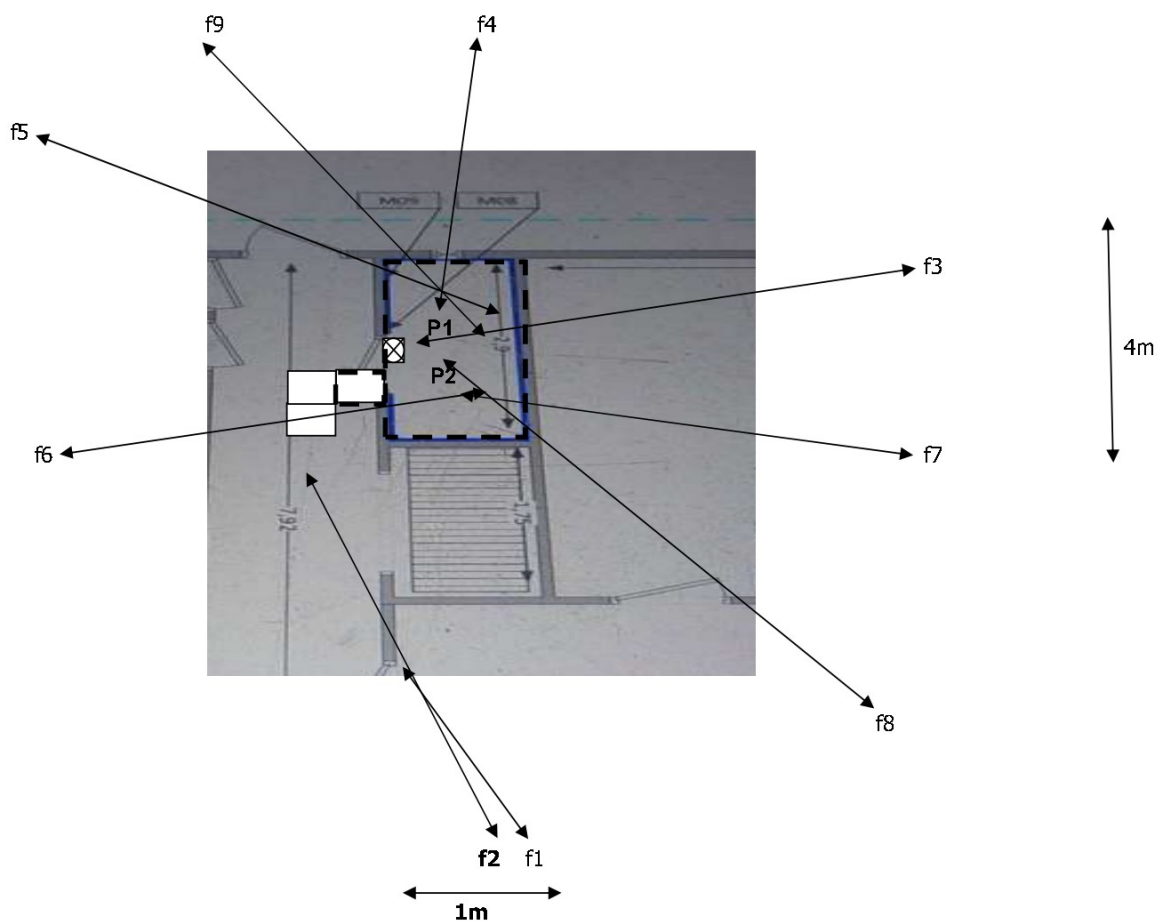

Opm: Tekening is niet op schaal

Hoogte per verdieping 3,0 meter

Legenda:													
Toilet	Weg	struiken	Bomen	Keuken	foto	meter	douche	dakpannen	rechte trap	wenteltrap	steen/rots	ODM	
Inspectiegebied													
containment	Deco-wagen	Sluis	Ruimte	Begrenzingslint	Meetpunten monsterneming								
					P1 P2 P3 P4								
					P5 P6								



INSPECTIE & LABORATORIUM DIENSTEN

Fotoblad behorende bij rapportage wettelijke eindcontrole na asbestsanering conform NEN2990.

Projectnummer: 23010258-2

Versienummer: 1

Plaats van onderzoek	Molenlaan 3 te Bergambacht
Type onderzoek	Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.
Omschrijving werkplek	betreft het verwijderen van lijm op tegels wanden toilet

Foto 1: Vooraanzicht woning/object

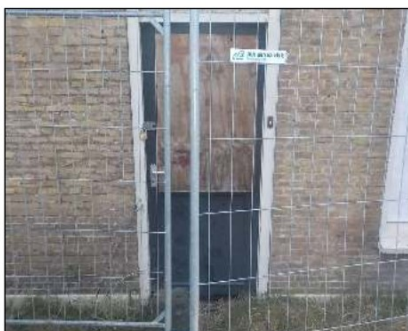


Foto 2: Sluis



Foto 3: Onderdrukmaschine



Foto 4: Pomp 1&2



Foto 5: Locatie gesaneerde bron 5



Foto 6: Locatie gesaneerde bron 5

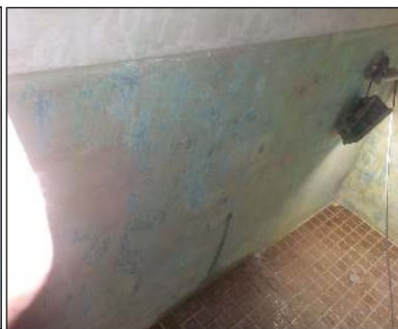


Foto 7: Locatie gesaneerde bron 5



Foto 8:



Foto 9:



Bijlage 1: Bevindingenrapport Visuele Inspectie Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering.
Projectnummer ANSAYA: 23010258-2

Utrecht, 31 januari 2023

Visuele inspectie, conform NEN 2990.
Versienummer: 1

Opdrachtgever en asbestverwijderingsbedrijf

Opdrachtgever: De Vries Asbestsanering

Asbestverwijderingsbedrijf

De Vries Asbestsanering
t.a.v. afdeling Asbestsanering
Welpoort 37AA
2415 BW Nieuwerburg
Ref.nr. opdrachtgever:
Contactpersoon:

20230137

Datum eindcontrole: 31 januari 2023
Starttijd visuele inspectie: 8:51
Eindtijd visuele inspectie: 9:16

Inspectie I: Inspectie randvoorwaarden

	Randvoorwaarden	Uitsluiting	Opmerkingen
1.	Is het inspectiegebied goed verlicht? (laet eventueel bouwklampen plaatsen).	ja	
2.	Zijn losstaande producten in het inspectiegebied aanwezig? (zo ja, laat deze producten na decontaminatie en controle uit het inspectiegebied verwijderen).	nee	Losstaande producten: Verwijderd; ja of nee :

Inspectie II: Inspectie van bouw/ en constructiedelen waar de asbesthoudende materialen op gemonteerd/gespoten waren

Segment	Locatie Bouwdeel	Resultaat			Opmerkingen
		constructiedeel	aangelegde delen	toplaag bodem	
1	toilet	v	v	v	

Overige opmerkingen inspectie deel II:

Wegens beperkte ruimte in het containment is er afgeweken van de vereiste meetopstelling van de pompen

Inspectie III (overige bouw- en constructiedelen in het 'containment' of de afgeschermd ruimte)

	Overige bouw- en constructiedelen	1									Opmerkingen
1	plafond (constructiedelen)	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	lathelanten en/of doorvoerbuizen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	ventilatiekanalen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	buizen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	verwarmingselementen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	kozijnen	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	ramen	v	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	vloer	v	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	machines, installaties	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Deco-unit	v	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gereedschappen en hulpmiddelen, stellingmateriaal, trappen, steigers, eventueel achtergebleven inbodem	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	
11											
12	Route waarlangs het afval is afgevoerd, transit-ruimte	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Toplaag bodem 5 meter van het bouwwerk of constructie (Buitensanering)	n.v.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Overige opmerkingen inspectie deel III:

Beperkingen visuele inspectie:

	Plaats van de beperking:	Beperking en reden hiervan:
Op de volgende plaatsen zijn er beperkingen betreffende het uitvoeren van de visuele inspectie:	betonwerk steenwerk	alle naden en kieren

Uitsluitingen visuele inspectie:

	Plaats van de uitsluiting	Uitsluiting en reden hiervan:
De volgende plaatsen dienen uitgesloten te worden van de visuele inspectie:	betonwerk steenwerk	ertussen erachter
	odm sluis containment	onder en achter alle afgeplakte delen

Inspectie werkplek: In orde bevonden

Verklaring symbolen:

v = in orde bevonden
v (2) = in orde bevonden na één Aanvullende schoonmaak
A = afgekeurd vanwege het aantreffen van asbest, asbestresten of stof dat/die vezelenismissie kan/kunnen veroorzaken; gehele ruimte moet opnieuw worden gereinigd
n.v.t. = niet van toepassing

Conclusie visuele inspectie:

De omgeschreven locatie(s) voldoen , op het moment van de inspectie, WEL aan de eisen zoals gesteld in de NEN2990, de benoemde uitsluitingen en opmerkingen in acht genomen.

Utrecht,
31 januari 2023

Opdrachtgever en asbestverwijderingsbedrijf

De Vries Asbestsanering
t.a.v. afdeling Asbestsanering
Weijpoort 37AA
2415 BW Nieuwerburg
Ref.nr. opdrachtgever
Contactpersoon: [REDACTED]

20230137

Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie.
Concentratie meting, onder accreditatie.
Incl. visuele inspectie. Zie bijgesloten pagina.
31 januari 2023

Datum meting

Type microscoop:	Fasecontrast
Blok 5 zichtbaar:	ja
Filtertype:	MCE Filters - Green Grid, 25mm, 0.8um

[illegible]

	Gem.	Nominaal	Onder-grens	Boven-grens	Nominaal gemiddelde overschreden?	Bovengrens gemiddelde overschreden?
	Ruimte 1					
P gem. = 1020,5 mbar	-	0,8731	0,2379	2,2356	nee	nee
T gem. = 3,5 °C	-	-	-	-	-	-
luchtvochtigheid buiten = 61 %	-	-	-	-	-	-
luchtvochtigheid binnen = 63 %	-	-	-	-	-	-

- De berekende gemiddelde concentraties in de gemeten ruimten zijn, getoetst aan de bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval, NIET normoverschrijdend (grenswaarde ministerie van SZW).

ANSAYA: Technisch eindverantwoordelijke

